

Kabelprotokoll

Projekt: GewerbePark Duisburg Neumühl


Erstellt am: 11.5.2026, 21:55:50

Zusammenfassung

Kabel gesamt: 149

Trommeln gesamt: 44

Plan: Halle - EG - Kabeltrassen

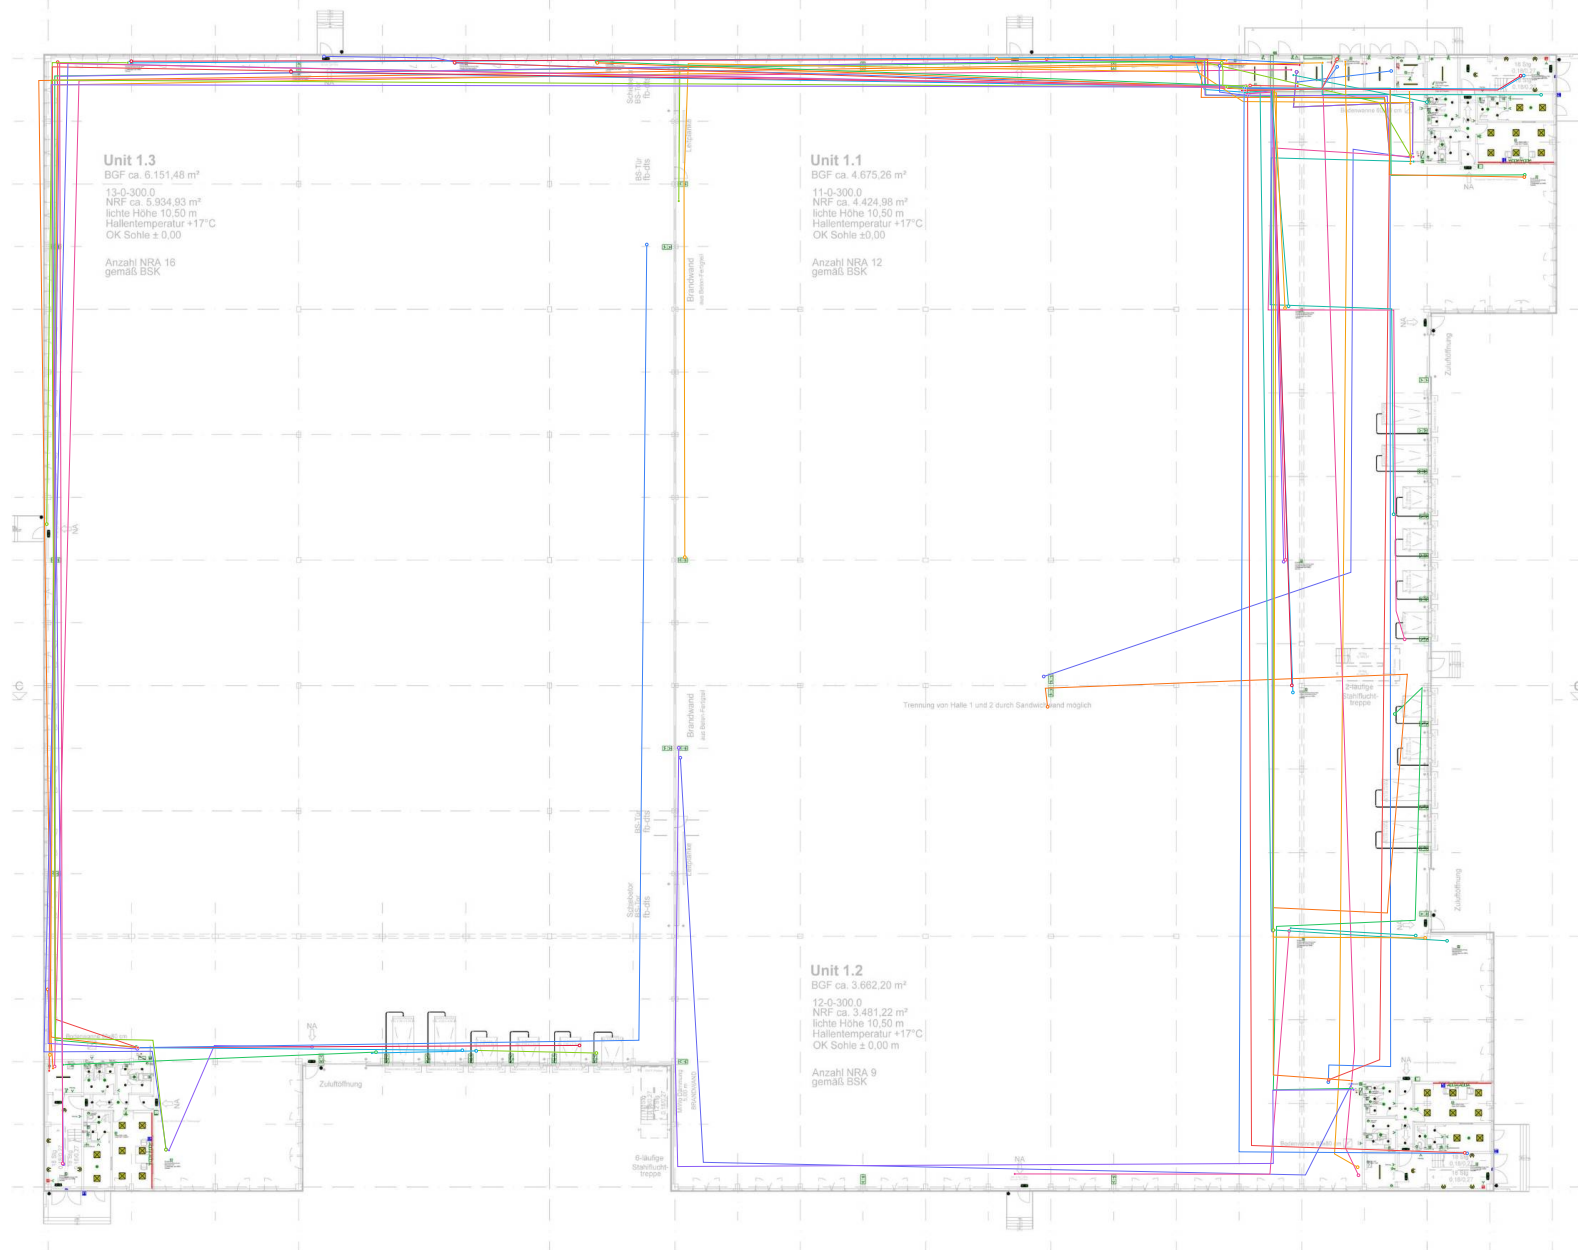[illegible]

Auftraggeber	Bauherrin
Zoo Zajac Grundbesitz GmbH Akazienallee 67-69 45478 Mülheim an der Ruhr	GwerberPark Duisburg Neumühl Konrad-Adenauer-Ring 6 47167 Duisburg

 Heinrich-Hertz-Straße 22a
40699 Erkrath
Tel: 0211 - 210233 - 00
Fax: 0211 - 210233 - 20
Mail: info@etecprojekt.de

Index	Änderungen	geändert am	geändert von

Item: 1	Projekt: Gewerbebau Duisburg Neumühl						
Größe: 1255*941							
Linie:	Zeichnung: Elektroinstallation						
Datex: ETEC0009	Gesamtschnitt EG						
Stand: 16.04.2026							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16.04.2026</td> <td>ETEC</td> </tr> <tr> <td>28.10.2026</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Datum	Name	16.04.2026	ETEC	28.10.2026		Gewerk: Elektrotechnik
Datum	Name						
16.04.2026	ETEC						
28.10.2026							
	Maßstab: 1:150						

Plan: Halle - EG – Kabelliste

#149 Zul BMZ

NY-Y-J 3x2.5
25 m
A 'BMZ

#148 Zul Siebe

NY-Y-J 3x2.5
25 m
A 'Siebe

#147 NSHV Brücke UV

NY-Y-J 7x2.5
35 m
A 'NSHV Brücke UV

#146 NSHV Brücke UV

A-2YF(L)2Y 4x2x0.8
38 m
A 'NSHV Brücke UV

#145 NSHV Brücke UV

A-2YF(L)2Y 10x2x0.8
35 m
A 'NSHV Brücke UV

#144 HSHV bis DSL Verbindung Unit 3

A-2YF(L)2Y 10x2x0.8
250 m
A 'DSL Verbindung Unit 3

#112 HSHV bis DSL Verbindung Unit 1

A-2YF(L)2Y 10x2x0.8
56 m
A 'DSL Verbindung Unit 1

#111 HSHV bis DSL Verbindung Unit 2

A-2YF(L)2Y 10x2x0.8
167 m
A 'DSL Verbindung Unit 2

#133 Cee 32A Halle 1.1

NY-Y-J 5x16
A 'Cee 32A Halle 1.1

#132 Brücke Aussenstrahler

NY-Y-J 5x2,5
20 m
A 'Brücke Aussenstrahler

#131 Brücke Aussenstrahler

NY-Y-J 5x2,5
15 m
A 'Brücke Aussenstrahler

#143 UV Allgemein Aussen- strahler

NY-Y-J 5x2,5
60 m
A 'UV Allgemein Aussenstrahler

#142 UV Allgemein Aussen- strahler

NY-Y-J 5x2,5
50 m
A 'UV Allgemein Aussenstrahler

#141 UV Allgemein Aussen- strahler

NY-Y-J 5x4
120 m
A 'UV Allgemein Aussenstrahler

#140 UV Allgemein Aussen- strahler

NY-Y-J 5x2,5
50 m
A 'UV Allgemein Aussenstrahler

#139 UV Allgemein Aussen- strahler

NY-Y-J 5x2,5
30 m
A 'UV Allgemein Aussenstrahler

#129 Brücke SIBE

NY-Y-J 3x2.5
30 m
A 'Brücke SIBE

#110 LVL Unit 1.2

A-DQ(ZN)B2Y 12 E9
130 m
A 'Serwer 2

#76 LVL Unit 1.1

A-DQ(ZN)B2Y 12 E9
60 m
A 'Serwer Uniz 1.1

#70 LVL Unit 1.3

A-DQ(ZN)B2Y 12 E9
250 m
A 'Serwer 1.3

#101 Reserve Tor

NY-Y-J 5x2,5
110 m
A 'Tor

#100 Reserve Tor

NY-Y-J 5x2,5
100 m
A 'Tor

#97 Einspeisung 2 virtueller Brandabschnitt D Halle Unit 1.3

NY-Y-J 3x2.5
122 m
Sibe Zentrale 'Virtueller Brandab-
schnitt D Halle Unit 1.3

#96 Einspeisung 1 virtueller Brandabschnitt D Halle Unit 1.3

NY-Y-J 3x2.5
120 m
Sibe Zentrale 'Virtueller Brandab-
schnitt D Halle Unit 1.3

#95 Brücken UV WP 1-2

A-2YF(L)2Y 4x2x0,8
157 m
A 'Brücken UV WP 1-2

#94 Brücken UV WP 1-2

STP 4x2X AWG23
100 m
HV Unit 1.1 'UV WP 2

#93 Brücken UV WP 1-3

A-2YF(L)2Y 10x2x0,8
250 m
HV Unit 1.1 'UV WP 3

**#92 Brücken UV WP 1-2**

A-2YF(L)2Y 4x2x0,8
269 m
HV Unit 1.1 'UV WP 2

**#91 Brücken UV WP 1-3**

A-2YF(L)2Y 10x2x0,8
278 m
HV Unit 1.1 'UV WP 3

**#90 Brücke SIBE Unit 2**

NY-Y 3x2,5
61 m
A 'Brücke SIBE Unit 2 Tür

**#58 Brücke SIBE Unit 1**

NY-Y 3x2,5
25 m
A 'Brücke SIBE Unit 1 Tür

**#88 Brücke SIBE Unit 1**

NY-Y 3x2,5
25 m
A 'Brücke SIBE Unit 1 Tür

**#87 Brücke SIBE Unit 3**

NY-Y 3x2,5
20 m
A 'Brücke SIBE Unit 3 Tür

**#86 Brücke SIBE Unit 3**

NY-Y 3x2,5
60 m
A 'Brücke SIBE Unit 3 Tür

**#82 4x CEE Steckdosen Unit 1.3 3x Tore + CEE**

NY-Y 5x2,5
60 m
HV vUnit 1.3 '4x CEE Steckdosen Unit 1.3 3x Tore + CEE

**#81 3x CEE Steckdosen Unit 1.3 3x Tore**

NY-Y 5x2,5
60 m
HV vUnit 1.3 'CEE Steckdosen Unit 1.3 3x Tore

**#80 2x CEE Steckdosen 32A Unit 1.3**

NY-Y 5x16
160 m
HV vUnit 1.3 '2x CEE Steckdosen Unit 1.3

**#62 4xCEE Steckdosen 32A Unit 1.3**

NY-Y 5x16
160 m
HV vUnit 1.3 '2X CEE Steckdosen Unit 1.3

**#79 4x CEE Steckdosen Unit 1.2 3xTore + CEE**

NY-Y 5x4
110 m
HV Unit 1.2 '4x CEE Steckdosen Unit 1.2 3x Tor +CEE

**#78 CEE Steckdose 32A Unit 1.2**

NY-Y 5x16
60 m
HV Unit 1.2 'CEE Steckdose 32A Unit 1.2

**#77 4x CEE Steckdosen 32A Unit 1.2**

NY-Y 5x16
130 m
HV Unit 1.2 '4x CEE Steckdosen Unit 1.2

**#75 3X CEE Stecdosen Halle 1.1 Kreis 4 3xTore**

NY-Y 5x4
120 m
HV Unit1.1 '4X CEE Stecdosen Halle 1.1 Kreis 4 3xTore + CEE

**#74 4X CEE Stecdosen Halle 1.1 Kreis 3 Tore**

NY-Y 5x2,5
80 m
HV Unit1.1 '4X CEE Stecdosen Halle 1.1 Kreis 3 Tore

**#73 4X CEE Stecdosen 32A Halle 1.1**

NY-Y 5x16
160 m
HV Unit1.1 '4X CEE Stecdosen Halle 1.1 Kreis 2

**#72 Einspeisung 2 Mezzanine EG Unit 1.3**

NY-Y 3x4
250 m
Sibe Zentrale 'Mezzanine EG Unit 1.3

**#71 Einspeisung 1 Mezzanine EG Unit 1.3**

NY-Y 3x4
250 m
Sibe Zentrale 'Mezzanine EG Unit 1.3

**#69 Einspeisung 2 virtueller Brandabschnitt C Halle Unit 1.3**

NY-Y 3x2,5
97 m
Sibe Zentrale 'Virtueller Brandabschnitt C Halle Unit 1.3virtueller Brandabschnitt C Halle Unit 1.3

**#68 Einspeisung 1 virtueller Brandabschnitt C Halle Unit 1.3**

NY-Y 3x2,5
95 m
Sibe Zentrale 'Virtueller Brandabschnitt C Halle Unit 1.3

**#67 Einspeisung 2 virtueller Brandabschnitt B Halle Unit 1.3**

NY-Y 3x2,5
87 m
Sibe Zentrale 'Virtueller Brandabschnitt B Halle Unit 1.3

**#66 Einspeisung 1 virtueller Brandabschnitt B Halle Unit 1.3**

NY-Y 3x2,5
85 m
Sibe Zentrale 'Virtueller Brandabschnitt B Halle Unit 1.3

**#65 Einspeisung 2 virtueller Brandabschnitt A Halle Unit 1.1**

NY-Y 3x2,5
71 m
Sibe Zentrale 'Virtueller Brandabschnitt A Halle Unit 1.3

**#64 Einspeisung 1 virtueller Brandabschnitt A Halle Unit 1.3****#63 Einspeisung 2 TRH Unit 1.3**

NY-Y 3x4

**#59 Einspeisung 1 TRH Unit 1.3**

NY-Y 3x4

NY-Y-J 3x2.5

70 m

Sibe Zentrale 'Einspeisung 1
virtueller Brandabschnitt A Halle
Unit irtueller Brandabschnitt A
Halle Unit 1.3

250 m

Sibe Zentrale 'TRH Unit 1.3

250 m

Sibe Zentrale 'TRH Unit 1.3



**#58 Einspeisung Mezzanine
EG Unit 1.2**

NY-Y-J 3x4

110 m

Sibe Zentrale 'Mezzanine EG Unit
1.2



**#57 Einspeisung 1 Mezza-
nine EG Unit 1.2**

NY-Y-J 3x4

110 m

Sibe Zentrale 'Mezzanine EG Unit
1.2



**#56 Einspeisung 2 virtueller
Brandabschnitt B Halle Unit
1.2**

NY-Y-J 3x2.5

95 m

Sibe Zentrale 'Virtueller Brandab-
schnitt B Halle Unit 1.2



**#55 Einspeisung 1 virtueller
Brandabschnitt B Halle Unit
1.2**

NY-Y-J 3x2.5

95 m

Sibe Zentrale 'Virtueller Brandab-
schnitt B Halle Unit 1.2



**#54 Einspeisung 2 virtueller
Brandabschnitt A Halle Unit
1.2**

NY-Y-J 3x2.5

71 m

Sibe Zentrale 'Virtueller Brandab-
schnitt A Halle Unit 1.2



**#53 Einspeisung 1 virtueller
Brandabschnitt A Halle Unit
1.2**

NY-Y-J 3x2.5

71 m

Sibe Zentrale 'Virtueller Brandab-
schnitt A Halle Unit 1.2



**#52 Einspeisung 2 TRH Unit
1.2**

NY-Y-J 3x4

130 m

Sibe Zentrale 'TRH Unit 1.2



**#51 Einspeisung 1 TRH Unit
1.2**

NY-Y-J 3x4

130 m

Sibe Zentrale 'TRH Unit 1.2



**#50 Einspeisung 2 Mezza-
nine EG Unit 1.1**

NY-Y-J 3x2,5

45 m

Sibe Zentrale 'Mezzanine EG Unit
1.1



**#49 Einspeisung 1 Mezza-
nine EG Unit 1.1**

NY-Y-J 3x2,5

46 m

Sibe Zentrale 'Mezzanine EG Unit
1.1



**#48 Einspeisung 2 virtueller
Brandabschnitt C Halle 1.1**

NY-Y-J 3x2,5

60 m

Sibe Zentrale 'Virtueller Brandab-
schnitt C Halle 1.1



**#47 Einspeisung 1 virtueller
Brandabschnitt C Halle 1.1**

NY-Y-J 3x2,5

60 m

Sibe Zentrale 'Virtueller Brandab-
schnitt C Halle 1.1



**#46 Einspeisung 2 virtueller
Brandabschnitt B Halle Unit
1.1**

NY-Y-J 3x2,5

32 m

Sibe Zentrale 'Virtueller Brandab-
schnitt B Halle Unit 1.1



**#45 Einspeisung 1 virtueller
Brandabschnitt B Halle Unit
1.1**

NY-Y-J 3x2,5

33 m

Sibe Zentrale 'Virtueller Brandab-
schnitt B Halle Unit 1.1



**#44 Einspeisung virtueller
Brandabschnitt A Halle Unit
1.1**

NY-Y-J 3x2,5

10 m

Sibe Zentrale 'Virtueller Brandab-
schnitt A Halle Unit 1.1



**#43 Einspeisung 1 virtueller
Brandabschnitt A Halle Unit
1.1**

NY-Y-J 3x2,5

10 m

Sibe Zentrale 'Virtueller Brandab-
schnitt A Halle Unit 1.1



**#42 Einspeisung 2 TRH Unit
1.1**

NY-Y-J 3x2,5

36 m

Sibe Zentrale 'TRH Unit 1.1



**#41 Einspeisung 1 TRH Unit
1.1**

NY-Y-J 3x2,5

36 m

Sibe Zentrale 'TRH Unit 1.1



**#40 Einspeisung 2 Tech-
nikräume**

NY-Y-J 3x2,5

20 m

Sibe Zentrale 'Technikraum 1.1





**#39 Einspeisung 1 Tech-
nikräume**

NY-Y-J 3x2,5

20 m

Sibe Zentrale 'Technikraum 1.1

Plan: Halle - OG - Kabeltrassen

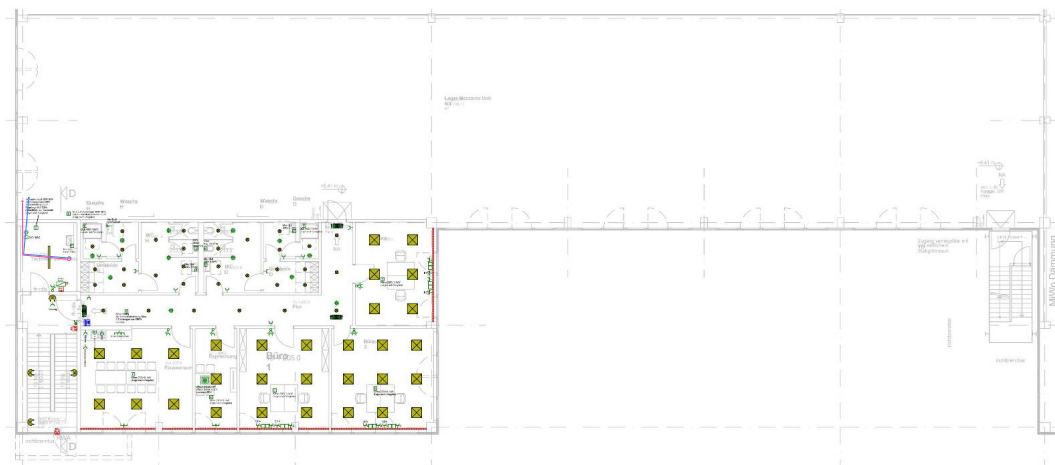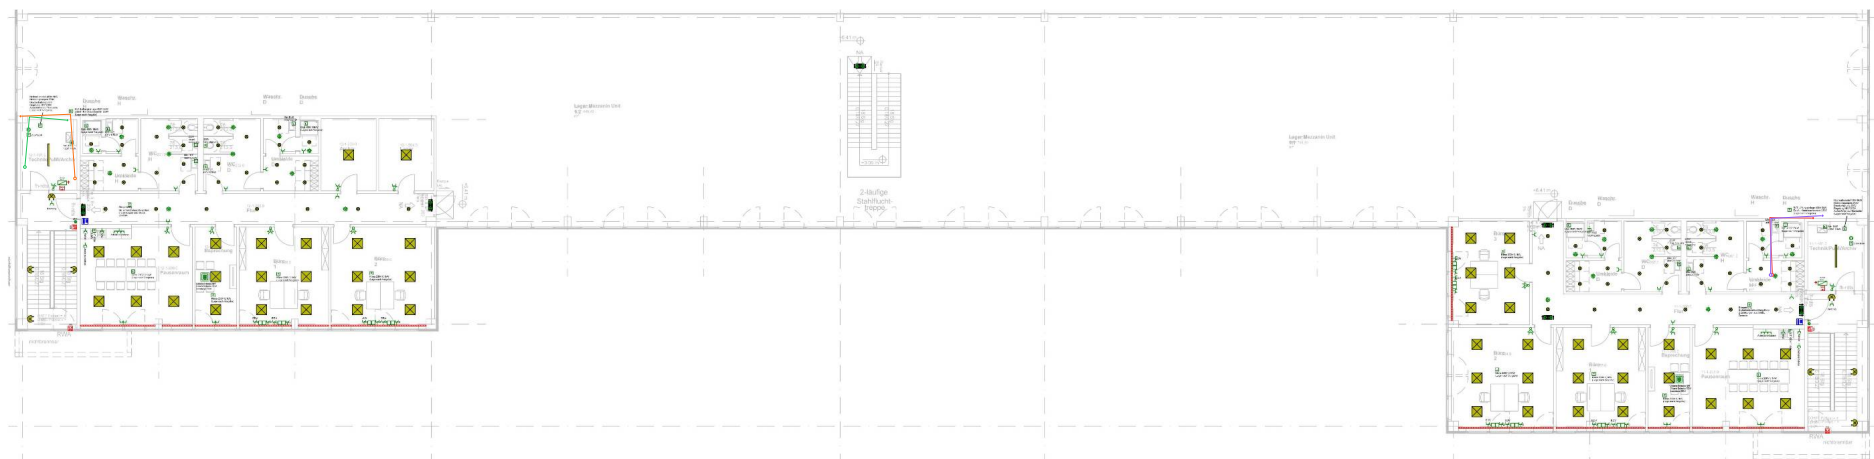

LEGENDE Elektrotechnik	
	RWA-Antrieb
	RWA Zentrale mit Notstromversorgung
	RWA Lichteraster
	Innensprechstelle
	LED-Anbau-FR-Leuchte
	Einbaudownlight
	Reifungszeichen-Leuchte
	Wand- und Deckenleuchte mit Bewegungsmelder
	Erdung allgemein
	Ausschalter
	Schaltkontakt
	Eigenkreislastler
	Pisiermelder
	Schuko Steckdose 1-fach
	Schuko 1-fach Steckdose Heizung
	Schuko Steckdose 2-fach
	Schuko Steckdose 2-fach (EDV)
	Elektrischer Anschluss, allgemein
	Ventilator
	Bruchsignal
	Biotank

Auftraggeber	Bauherrn
Zoo Zajac Grundbesitz GmbH Akazienallee 67-69 45478 Mülheim an der Ruhr	GwerbePark Duisburg Neumühl Konrad-Adenauer-Ring 6 47167 Duisburg

 Heinrich-Hertz-Straße 22a
40699 Erkrath
Tel.: 0211 - 210233 - 00
Fax: 0211 - 210233 - 20
Mail: info@etecprojekt.de


A	Einweisungen, Sicherheitsbeurteilung	16.04.2026	ETEC
Index	Änderungen	geändert am	geändert von

Blatt: 1	Projekt: Gewerbepark Duisburg Neumühl								
Größe: A0									
Unser: Ernsthaus/Garcia	Zeichnung: Elektroinstallation								
Datum: ETEC010	Unit 1.1 - 1.2 - 1.3								
Stand: 30.10.2025	Mezzanine								
<table><tr><th>Datum</th><th>Name</th></tr><tr><td>30.10.2025</td><td>ETEC</td></tr><tr><td>30.10.2025</td><td></td></tr></table>	Datum	Name	30.10.2025	ETEC	30.10.2025		Gesamt:	Maßstab: 1:100	
Datum	Name								
30.10.2025	ETEC								
30.10.2025									
Elektrotechnik									

Plan: Halle - OG – Kabelliste

#144 HSHV bis DSL Verbindung Unit 3 A-2YF(L)2Y 10x2x0.8 250 m A 'DSL Verbindung Unit 3	#112 HSHV bis DSL Verbindung Unit 1 A-2YF(L)2Y 10x2x0.8 56 m A 'DSL Verbindung Unit 1	#111 HSHV bis DSL Verbindung Unit 2 A-2YF(L)2Y 10x2x0.8 167 m A 'DSL Verbindung Unit 2
#110 LVL Unit 1.2 A-DQ(ZN)B2Y 12 E9 130 m A 'Serwer 2	#76 LVL Unit 1.1 A-DQ(ZN)B2Y 12 E9 60 m A 'Serwer Uniz 1.1	#70 LVL Unit 1.3 A-DQ(ZN)B2Y 12 E9 250 m A 'Serwer 1.3

Plan: BMA - Gross Alles - Kabeltrassen

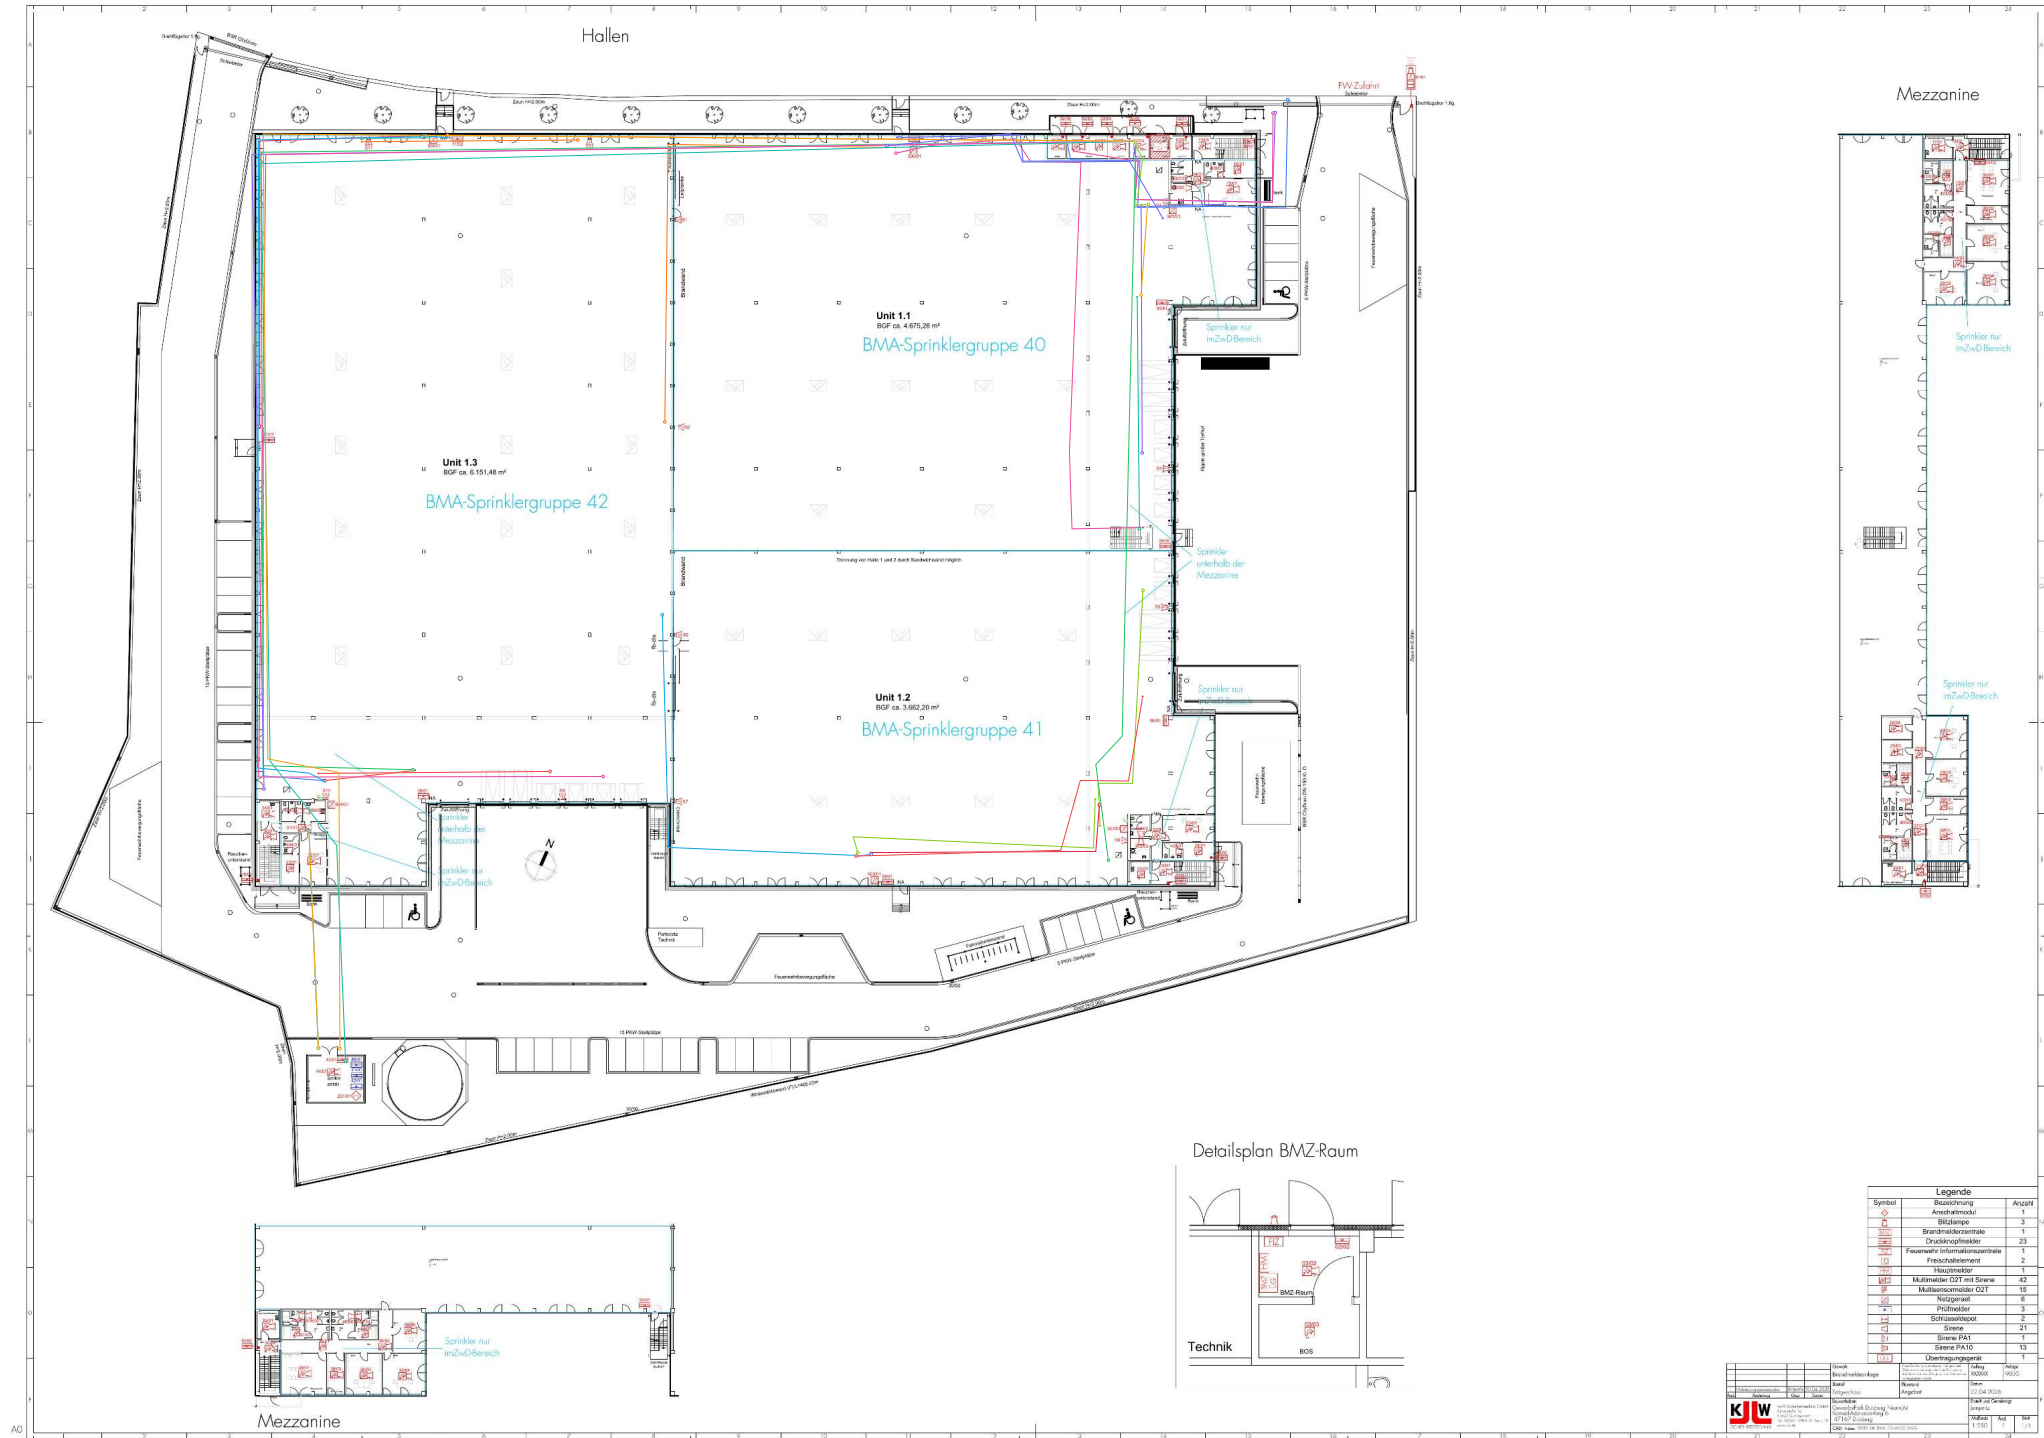

Plan: BMA - Gross Alles – Kabelliste



#130 Antrieb Tor

NY-Y 5x2,5

80 m

A 'Antrieb Tor



#138 Brücke S10 bis S9

A-2YF(L)2Y 4x2x0,8

43 m

A 'Brücke Netzteil bis S11



#137 Brücke Netzteil bis S11

A-2YF(L)2Y 4x2x0,8

14 m

A 'Brücke Netzteil bis S11



#136 Brücke S11 bis S12

A-2YF(L)2Y 4x2x0,8

57 m

A 'Brücke S11 bis S12



#135 Koppler FW-Zufahrt

A-2YF(L)2Y 4x2x0,8

86 m

A 'FW-Zufahrt



#134 Schiebetor Antrieb bitte machen

NY-Y 5x2,5

80 m

A 'FW-Zufahrt



#128 Brücke 4 Mezzanine Unit 1.3 bis Sprinkler Kabel 2

A-2YF(L)2Y 2x2x0,8

81 m

A 'Brücke 4 Mezzanine Unit 1.3 bis
Sprinkler Kabel 1



#127 Brücke 4 Mezzanine Unit 1.3 bis Sprinkler Kabel 1

A-2YF(L)2Y 2x2x0,8

81 m

A 'Brücke 4 Mezzanine Unit 1.3 bis
Sprinkler Kabel 1



#61 Loop 1 Halle 1.1 Mezza- nine + THR + Technik Kabel 1

A-2YF(L)2Y 2x2x0,8

101 m

A 'Loop 2 Halle 1.1 Mezzanine +
THR + Technik Kabel 1



#126 Brücke Sirene S5 bis S6

A-2YF(L)2Y 4x2x0,8

71 m

A 'Brücke Sirene S5 bis S6



#125 2x Sirene S7 und S8 4m Hoch

A-2YF(L)2Y 4x2x0,8

114 m

A '2x Sirene S7 und S8 4m Hoch



#124 Brücke Loop 5 Halle 1.2

A-2YF(L)2Y 2x2x0,8

50 m

A 'Brücke Loop 5 Halle 1.2



#123 Brücke Loop 5 Halle 1.2

A-2YF(L)2Y 2x2x0,8

6 m

A 'Brücke Loop 5 Halle 1.2



#122 Brücke Loop 5 Halle 1.2

A-2YF(L)2Y 2x2x0,8

81 m

A 'Brücke Loop 5 Halle 1.2



#121 Loop 5 Halle 1.2 Kabel 2

A-2YF(L)2Y 2x2x0,8

357 m

A 'Loop 5 Halle 1.2 Kabel 2



#119 2x Sirene S1 und S2 4m hoch

A-2YF(L)2Y 4x2x0,8

97 m

A '2x Sirene S1 und S2 4m hoch



#118 Brücke Sirene S3 bis S4

A-2YF(L)2Y 4x2x0,8

54 m

A 'Brücke Sirene S3 bis S4



#117 Brücke Loop 2 Halle 1.1

A-2YF(L)2Y 2x2x0,8

143 m

A 'Brücke Loop 2 Halle 1.1



#116 Brücke Loop 2 Halle 1.1

A-2YF(L)2Y 2x2x0,8

43 m

A 'Brücke Loop 2 Halle 1.1



#115 Brücke Loop 2 Halle 1.1

A-2YF(L)2Y 2x2x0,8

21 m

A 'Brücke Loop 2 Halle 1.1



#114 Loop 2 Halle 1.1 Kabel 2

A-2YF(L)2Y 2x2x0,8

54 m

A 'Loop 2 Halle 1.1 Kabel 2



#113 Loop 2 Halle 1.1 Kabel 1

A-2YF(L)2Y 2x2x0,8

22 m

A 'Loop 2 Halle 1.1 Kabel 1



#109 Brücke BMA

A-2YF(L)2Y 2x2x0,8

10 m

A 'BMA



#108 Brücke BMA

A-2YF(L)2Y 2x2x0,8

73 m

A 'BMA



#107 Brücke BMA

A-2YF(L)2Y 2x2x0,8

80 m

A 'BMA



#106 Brücke BMA

A-2YF(L)2Y 2x2x0,8

31 m

A 'BMA



#105 Loop 3 Halle 1.3 Kabel 2

A-2YF(L)2Y 2x2x0,8

260 m

BMA Zentrale 'Loop 3 Halle 1.3
Handmelder



#104 Loop 3 Halle 1.3 Kabel 1

A-2YF(L)2Y 2x2x0,8

120 m

BMA Zentrale 'Halle 1.3 Hand-
melder



#103 Loop 4 Mezzanine Unit 1.3 Kabel 2

A-2YF(L)2Y 2x2x0,8

240 m

BMA Zentrale 'Technik Unit 1.3



#102 Loop 4 Mezzanine Unit 1.3 Kabel 1

A-2YF(L)2Y 2x2x0,8

300 m

BMA Zentrale 'Mezzanine Unit 1.3



#99 Loop 6 Sprinkler Kabel 2

A-2YF(L)2Y 2x2x0,8

380 m

BMA Zentrale 'Sprinkler



#98 Loop 6 Sprinkler Kabel 1

A-2YF(L)2Y 2x2x0,8

365 m

BMA Zentrale 'Sprinkler



#85 Zuleitung 230V Netzteil BMA Unit 1.1

NY-Y-J 3x2,5

61 m

A 'Netzteil BMA Unit 1.1



#84 Zuleitung 230V Netzteil BMA Unit 1.2

NY-Y-J 3x2,5

50 m

A 'Netzteil BMA Unit 1.2



#83 Zuleitung 230V Netzteil BMA Unit 1.3

NY-Y-J 3x2,5

122 m

Punkt A 'Netzteil BMA Unit 1.3

Plan: BMA - Mezzanine – Kabelliste

#61 Loop 1 Halle 1.1 Mezzanine + THR + Technik Kabel 1

A-2YF(L)2Y 2x2x0,8

101 m

A 'Loop 2 Halle 1.1 Mezzanine + THR + Technik Kabel 1


#121 Loop 5 Halle 1.2 Kabel 2

A-2YF(L)2Y 2x2x0,8

357 m

A 'Loop 5 Halle 1.2 Kabel 2

Plan: Halle - GrabenPlan - Kabeltrassen

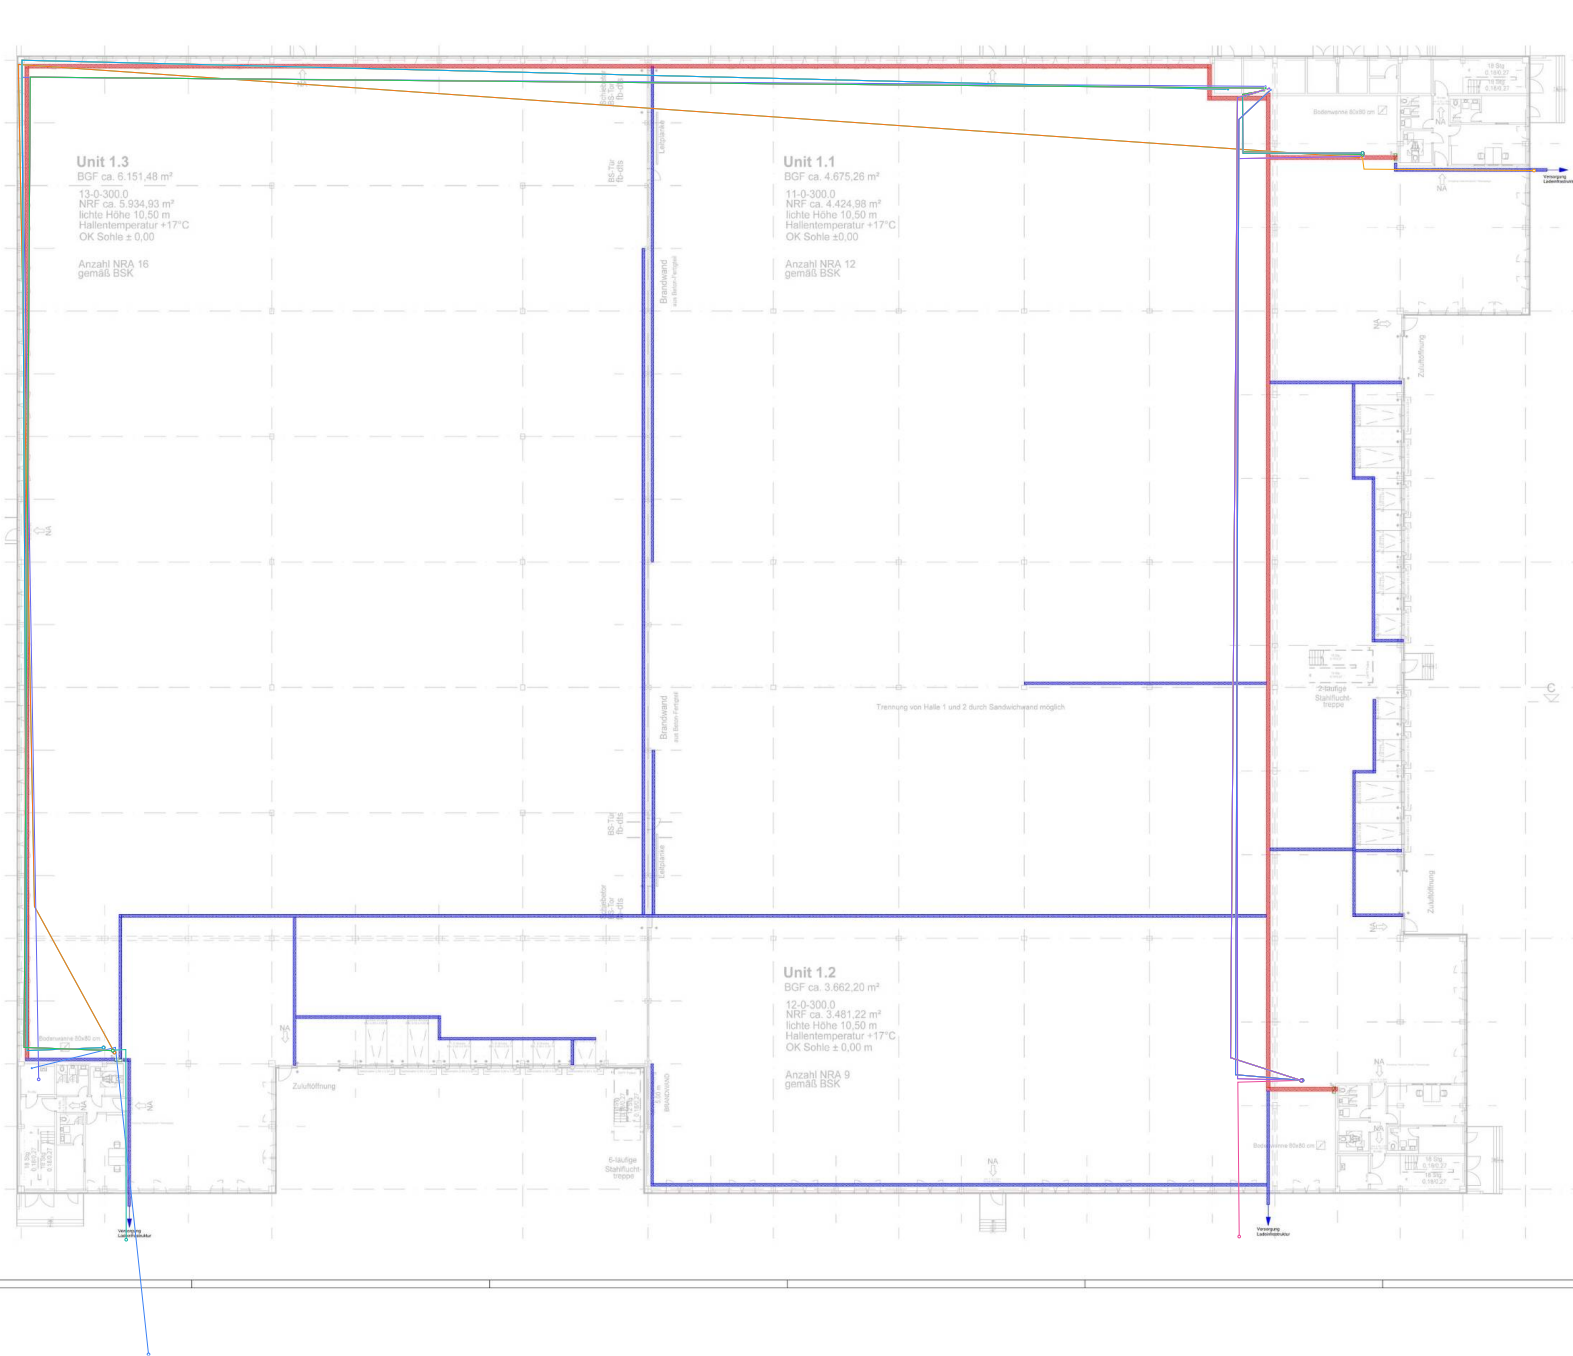[illegible]

Plan: Halle - GrabenPlan – Kabelliste

#60 Sprinkler zentrale Zuleitung NAYY-J 5x35 100 m UV Allgemein 'Sprikler	#38 Brücke HV 1 zu HV 2-A-2YF(L)2Y 10x2x0,8 A-2YF(L)2Y 10x2x0,8 115 m HV Unit 1 'HV Unit 2	#37 Brücke HV 1 zu HV 3-A-2YF(L)2Y 10x2x0,8 A-2YF(L)2Y 10x2x0,8 350 m HV Unit 1 'HV Unit 3
#36 Brücke HV 1 zu HV 3-NYY-J 7x2,5 NYY-J 7x2,5 350 m HV Unit 1 'HV Unit 3	#35 Brücke HV 1 zu HV 2-NYY-J 7x2,5 NYY-J 7x2,5 115 m HV Unit 1 'HV Unit 2	#34 Ladesäulen HV2 NYY-J 5x25 33 m HV Unit 2 'Draußen Ladesäle
#33 Ladesäulen HV3 NYY-J 5x25 33 m HV Unit 3 'Draußen Ladesäle	#32 Ladesäulen HV1 NYY-J 5x25 33 m HV Unit 1 'Draussen Ladesäle	#31 UV Allg. EG Unit 3 NAYY-J 5x35 250 m NSHV 'UV Allg. EG Unit 3
#30 UV WP Unit 1 PE NAYY-O 1x120 35 m NSHV 'UV WP Unit 1	#29 HV Unit 1 PE NAYY-O 1x120 35 m NHSV 'NSHV HV Unit 1	#28 UV WP Unit 1 N NAYY-O 1x240 35 m NSHV 'UV WP Unit 1
#27 UV WP Unit 1 L3 NAYY-O 1x240 35 m NSHV 'UV WP Unit 1	#26 UV WP Unit 1 L2 NAYY-O 1x240 35 m NSHV 'UV WP Unit 1	#25 UV WP Unit 1 L1 NAYY-O 1x240 35 m NSHV 'UV WP Unit 1
#24 NSHV HV Unit 1 N NAYY-O 1x240 35 m NHSV 'NSHV HV Unit 1	#23 NSHV HV Unit 1 L3 NAYY-O 1x240 35 m NHSV 'NSHV HV Unit 1	#22 NSHV HV Unit 1 L2 NAYY-O 1x240 35 m NHSV 'NSHV HV Unit 1
#21 NSHV HV Unit 1 L1 NAYY-O 1x240 35 m NHSV 'NSHV HV Unit 1	#20 UV WP Unit 2 PE NAYY-O 1x120 115 m NSHV 'UV WP Unit 2	#19 HV Unit 2 PE NAYY-O 1x120 115 m NSHV 'HV Unit 2
#18 UV WP Unit 2 N NAYY-O 1x240 115 m NSHV 'HV Unit 2	#17 UV WP Unit 2 L3 NAYY-O 1x240 115 m NSHV 'UV WP Unit 2	#16 UV WP Unit 2 L2 NAYY-O 1x240 115 m NSHV 'UV WP Unit 2
#15 UV WP Unit 2 L1 NAYY-O 1x240 115 m NSHV 'UV WP Unit 2	#14 HV Unit 2 N NAYY-O 1x240 115 m NSHV 'HV Unit 2	#13 HV Unit 2 L3 NAYY-O 1x240 115 m NSHV 'HV Unit 2
#12 HV Unit 2 L2 NAYY-O 1x240 115 m NSHV 'HV Unit 2	#11 HV Unit 2 L1 NAYY-O 1x240 115 m NSHV 'HV Unit 2	#10 UV WP Unit 3 PE NAYY-O 1x120 240 m NSHV 'UV WP Unit 3

**#9 HV Unit 3 PE**

NAYY-O 1x120
240 m
NSHV 'HV Unit 3

**#8 UV WP Unit 3 N**

NAYY-O 1x240
240 m
NSHV 'UV WP Unit 3

**#7 UV WP Unit 3 L3**

NAYY-O 1x240
240 m
NSHV 'UV WP Unit 3

**#6 UV WP Unit 3 L2**

NAYY-O 1x240
240 m
NSHV 'UV WP Unit 3

**#5 UV WP Unit 3 L1**

NAYY-O 1x240
240 m
NSHV 'UV WP Unit 3

**#4 HV Unit 3 N**

NAYY-O 1x240
240 m
NSHV 'HV Unit 3

**#3 HV Unit 3 L3**

NAYY-O 1x240
240 m
NSHV 'HV Unit 3

**#2 HV Unit 3 L2**

NAYY-O 1x240
240 m
NSHV 'HV Unit 3

**#1 HV Unit 3 L1**

NAYY-O 1x240
240 m
NSHV 'HV Unit 3

Kabelliste

Name / Kabeltyp	Status	Trommel / Länge	Trasse	QR-Code
#149 Zul BMZ Typ: NY-Y-J 3x2.5	Fertig	NY-Y-J 3x2,5 Trommel 4 25m	A 'BMZ	
#148 Zul Siebe Typ: NY-Y-J 3x2.5	Fertig	NY-Y-J 3x2,5 Trommel 3 25m	A 'Siebe	
#147 NSHV Brücke UV Typ: NY-Y-J 7x2.5	Fertig	Halle Uvs Brücken 35m	A 'NSHV Brücke UV	
#146 NSHV Brücke UV Typ: A-2YF(L)2Y 4x2x0.8	Fertig	UV Brücken 4x2x0,8 38m	A 'NSHV Brücke UV	
#145 NSHV Brücke UV Typ: A-2YF(L)2Y 10x2x0.8	Fertig	Serverraum Brücken 35m	A 'NSHV Brücke UV	
#144 HSHV bis DSL Verbindung Unit 3 Typ: A-2YF(L)2Y 10x2x0.8	Fertig	Serverraum Brücken 250m	A 'DSL Verbindung Unit 3	
#112 HSHV bis DSL Verbindung Unit 1 Typ: A-2YF(L)2Y 10x2x0.8	Fertig	Hallen UV Brücke A-2YF(L)2Y 10x2x0,8 56m	A 'DSL Verbindung Unit 1	
#111 HSHV bis DSL Verbindung Unit 2 Typ: A-2YF(L)2Y 10x2x0.8	Fertig	Hallen UV Brücke A-2YF(L)2Y 10x2x0,8 167m	A 'DSL Verbindung Unit 2	
#133 Cee 32A Halle 1.1 Typ: NY-Y-J 5x16	Fertig	Mennekes Hallen Trommel 2	A 'Cee 32A Halle 1.1	
#132 Brücke Aussenstrahler Typ: NY-Y-J 5x2,5	Fertig	NY-Y-J 5x2,5 Trommel 1 20m	A 'Brücke Aussenstrahler	
#131 Brücke Aussenstrahler Typ: NY-Y-J 5x2,5	Fertig	NY-Y-J 5x2,5 Trommel 1 15m	A 'Brücke Aussenstrahler	
#130 Antrieb Tor Typ: NY-Y-J 5x2,5	Fertig	NY-Y-J 5x2,5 Trommel 1 80m	A 'Antrieb Tor	
#143 UV Allgemein Aussenstrahler Typ: NY-Y-J 5x2,5	Fertig	NY-Y-J 5x2,5 Trommel 1 60m	A 'UV Allgemein Aussenstrahler	
#142 UV Allgemein Aussenstrahler Typ: NY-Y-J 5x2,5	Fertig	NY-Y-J 5x2,5 Trommel 1 50m	A 'UV Allgemein Aussenstrahler	

#141 UV Allgemein Aussenstrahler Typ: NYY-J 5x4	Fertig	NYY-J 5x4 Trommel 1 120m	A 'UV Allgemein Aussenstrahler	
#140 UV Allgemein Aussenstrahler Typ: NYY-J 5x2,5	Fertig	NYY-J 5x2,5 Trommel 1 50m	A 'UV Allgemein Aussenstrahler	
#139 UV Allgemein Aussenstrahler Typ: NYY-J 5x2,5	Fertig	NYY-J 5x2,5 Trommel 2 30m	A 'UV Allgemein Aussenstrahler	
#138 Brücke S10 bis S9 Typ: A-2YF(L)2Y 4x2x0,8	Fertig	UV Brücken 4x2x0,8 43m	A 'Brücke Netzteil bis S11	
#137 Brücke Netzteil bis S11 Typ: A-2YF(L)2Y 4x2x0,8	Fertig	BMA Sirenen 14m	A 'Brücke Netzteil bis S11	
#136 Brücke S11 bis S12 Typ: A-2YF(L)2Y 4x2x0,8	Fertig	BMA Sirenen 57m	A 'Brücke S11 bis S12	
#135 Koppler FW-Zufahrt Typ: A-2YF(L)2Y 4x2x0,8	Fertig	BMA Sirenen 86m	A 'FW-Zufahrt	
#134 Schiebetor Antrieb bitte machen Typ: NYY-J 5x2,5	Fertig	NYY-J 5x2,5 Trommel 2 80m	A 'FW-Zufahrt	
#129 Brücke SIBE Typ: NYY-J 3x2,5	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 4 30m	A 'Brücke SIBE	
#128 Brücke 4 Mezzanine Unit 1.3 bis Sprinkler Kabel 2 Typ: A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	Fertig	BMA Erdkabel Trommel 3 81m	A 'Brücke 4 Mezzanine Unit 1.3 bis Sprinkler Kabel 1	
#127 Brücke 4 Mezzanine Unit 1.3 bis Sprinkler Kabel 1 Typ: A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	Fertig	BMA Erdkabel Trommel 3 81m	A 'Brücke 4 Mezzanine Unit 1.3 bis Sprinkler Kabel 1	
#61 Loop 1 Halle 1.1 Mezzanine + THR + Technik Kabel 1 Typ: A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	Fertig	BMA Erdkabel Trommel 3 101m	A 'Loop 2 Halle 1.1 Mezzanine + THR + Technik Kabel 1	
#126 Brücke Sirene S5 bis S6 Typ: A-2YF(L)2Y 4x2x0,8	Fertig	BMA Sirenen 71m	A 'Brücke Sirene S5 bis S6	
#125 2x Sirene S7 und S8 4m Hoch Typ: A-2YF(L)2Y 4x2x0,8	Fertig	BMA Sirenen 114m	A '2x Sirene S7 und S8 4m Hoch	
#124 Brücke Loop 5 Halle 1.2 Typ: A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	Fertig	BMA Erdkabel Trommel 3 50m	A 'Brücke Loop 5 Halle 1.2	

#123 Brücke Loop 5 Halle 1.2 Typ: A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	Fertig	BMA Erdkabel Trommel 3 6m	A 'Brücke Loop 5 Halle 1.2	
#122 Brücke Loop 5 Halle 1.2 Typ: A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	Fertig	BMA Erdkabel Trommel 3 81m	A 'Brücke Loop 5 Halle 1.2	
#121 Loop 5 Halle 1.2 Kabel 2 Typ: A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	Fertig	BMA Erdkabel Trommel 5 357m	A 'Loop 5 Halle 1.2 Kabel 2	
#120 Loop 5 Halle 1.2 Kabel 1 Typ: A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	Fertig	BMA Erdkabel Trommel 3 101m	-	
#119 2x Sirene S1 und S2 4m hoch Typ: A-2YF(L)2Y 4x2x0,8	Fertig	UV Brücken 4x2x0,8 97m	A '2x Sirene S1 und S2 4m hoch	
#118 Brücke Sirene S3 bis S4 Typ: A-2YF(L)2Y 4x2x0,8	Fertig	UV Brücken 4x2x0,8 54m	A 'Brücke Sirene S3 bis S4	
#117 Brücke Loop 2 Halle 1.1 Typ: A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	Fertig	BMA Erdkabel Trommel 5 143m	A 'Brücke Loop 2 Halle 1.1	
#116 Brücke Loop 2 Halle 1.1 Typ: A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	Fertig	BMA Erdkabel Trommel 2 2x2x0,8 43m	A 'Brücke Loop 2 Halle 1.1	
#115 Brücke Loop 2 Halle 1.1 Typ: A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	Fertig	BMA Erdkabel Trommel 1 2x2x0,8 21m	A 'Brücke Loop 2 Halle 1.1	
#114 Loop 2 Halle 1.1 Kabel 2 Typ: A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	Fertig	BMA Erdkabel Trommel 2 2x2x0,8 54m	A 'Loop 2 Halle 1.1 Kabel 2	
#113 Loop 2 Halle 1.1 Kabel 1 Typ: A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	Fertig	BMA Erdkabel Trommel 2 2x2x0,8 22m	A 'Loop 2 Halle 1.1 Kabel 1	
#110 LVL Unit 1.2 Typ: A-DQ(ZN)B2Y 12 E9	Fertig	LVL Singlemode 130m	A 'Serwer 2	
#76 LVL Unit 1.1 Typ: A-DQ(ZN)B2Y 12 E9	Fertig	LVL Singlemode 60m	A 'Serwer Uniz 1.1	
#70 LVL Unit 1.3 Typ: A-DQ(ZN)B2Y 12 E9	Fertig	LVL Singlemode 250m	A 'Serwer 1.3	
#109 Brücke BMA Typ: A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	Fertig	BMA Erdkabel Trommel 1 2x2x0,8 10m	A 'BMA	

#108 Brücke BMA Typ: A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	Fertig	BMA Erdkabel Trommel 1 2x2x0,8 73m	A 'BMA	
#107 Brücke BMA Typ: A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	Fertig	BMA Erdkabel Trommel 3 2x2x0,8 80m	A 'BMA	
#106 Brücke BMA Typ: A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	Fertig	BMA Erdkabel Trommel 1 2x2x0,8 31m	A 'BMA	
#105 Loop 3 Halle 1.3 Kabel 2 Typ: A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	Fertig	BMA Erdkabel Trommel 4 260m	BMA Zentrale 'Loop 3 Halle 1.3 Handmelder	
#104 Loop 3 Halle 1.3 Kabel 1 Typ: A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	Fertig	BMA Erdkabel Trommel 3 2x2x0,8 120m	BMA Zentrale 'Halle 1.3 Handmelder	
#103 Loop 4 Mezzanine Unit 1.3 Kabel 2 Typ: A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	Fertig	BMA Erdkabel Trommel 4 240m	BMA Zentrale 'Technik Unit 1.3	
#102 Loop 4 Mezzanine Unit 1.3 Kabel 1 Typ: A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	Fertig	BMA Erdkabel Trommel 3 2x2x0,8 300m	BMA Zentrale 'Mezza- nine Unit 1.3	
#101 Reserve Tor Typ: NY-Y-J 5x2,5	Fertig	NY-Y-J 5x2,5 Trommel 2 110m	A 'Tor	
#100 Reserve Tor Typ: NY-Y-J 5x2,5	Fertig	NY-Y-J 5x2,5 Trommel 2 100m	A 'Tor	
#99 Loop 6 Sprinkler Kabel 2 Typ: A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	Fertig	BMA Erdkabel Trommel 2 2x2x0,8 380m	BMA Zentrale 'Sprinkler	
#98 Loop 6 Sprinkler Kabel 1 Typ: A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	Fertig	BMA Erdkabel Trommel 1 2x2x0,8 365m	BMA Zentrale 'Sprinkler	
#97 Einspeisung 2 virtueller Brandabschnitt D Halle Unit 1.3 Typ: NY-Y-J 3x2,5	Fertig	NY-Y-J 3x2,5 Trommel 1 122m	Sibe Zentrale 'Virtueller Brandabschnitt D Halle Unit 1.3	
#96 Einspeisung 1 virtueller Brandabschnitt D Halle Unit 1.3 Typ: NY-Y-J 3x2,5	Fertig	NY-Y-J 3x2,5 Trommel 2 120m	Sibe Zentrale 'Virtueller Brandabschnitt D Halle Unit 1.3	
#95 Brücken UV WP 1-2 Typ: A-2YF(L)2Y 4x2x0,8	Fertig	BMA Sirenen 157m	A 'Brücken UV WP 1-2	
#94 Brücken UV WP 1-2 Typ: STP 4x2X AWG23	Fertig	UV Brücken Simplex Erdkabel 100m	HV Unit 1.1 'UV WP 2	

#93 Brücken UV WP 1-3 Typ: A-2YF(L)2Y 10x2x0,8	Fertig	UV Brücken Simplex Erdkabel 250m	HV Unit 1.1 'UV WP 3	
#92 Brücken UV WP 1-2 Typ: A-2YF(L)2Y 4x2x0,8	Fertig	UV Brücken 4x2x0,8 269m	HV Unit 1.1 'UV WP 2	
#91 Brücken UV WP 1-3 Typ: A-2YF(L)2Y 10x2x0,8	Fertig	Hallen UV Brücke A-2YF(L)2Y 10x2x0,8 278m	HV Unit 1.1 'UV WP 3	
#90 Brücke SIBE Unit 2 Typ: NYY-J 3x2,5	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 1 61m	A 'Brücke SIBE Unit 2 Tür	
#58 Brücke SIBE Unit 1 Typ: NYY-J 3x2,5	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 2 25m	A 'Brücke SIBE Unit 1 Tür	
#88 Brücke SIBE Unit 1 Typ: NYY-J 3x2,5	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 2 25m	A 'Brücke SIBE Unit 1 Tür	
#87 Brücke SIBE Unit 3 Typ: NYY-J 3x2,5	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 3 20m	A 'Brücke SIBE Unit 3 Tür	
#86 Brücke SIBE Unit 3 Typ: NYY-J 3x2,5	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 3 60m	A 'Brücke SIBE Unit 3 Tür	
#85 Zuleitung 230V Netzteil BMA Unit 1.1 Typ: NYY-J 3x2,5	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 1 61m	A 'Netzteil BMA Unit 1.1	
#84 Zuleitung 230V Netzteil BMA Unit 1.2 Typ: NYY-J 3x2,5	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 3 50m	A 'Netzteil BMA Unit 1.2	
#83 Zuleitung 230V Netzteil BMA Unit 1.3 Typ: NYY-J 3x2,5	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 4 122m	Punkt A 'Netzteil BMA Unit 1.3	
#82 4x CEE Steckdosen Unit 1.3 3x Tore + CEE Typ: NYY-J 5x2,5	Fertig	NYY-J 5x2,5 Trommel 1 60m	HV vUnit 1.3 '4x CEE Steckdosen Unit 1.3 3x Tore + CEE	
#81 3x CEE Steckdosen Unit 1.3 3x Tore Typ: NYY-J 5x2,5	Fertig	NYY-J 5x2,5 Trommel 1 60m	HV vUnit 1.3 'CEE Steckdosen Unit 1.3 3x Tore	
#80 2x CEE Steckdosen 32A Unit 1.3 Typ: NYY-J 5x16	Fertig	Mennekes Hallen Trommel 1 160m	HV vUnit 1.3 '2x CEE Steckdosen Unit 1.3	
#62 4xCEE Steckdosen 32A Unit 1.3 Typ: NYY-J 5x16	Fertig	Mennekes Hallen Trommel 1 160m	HV vUnit 1.3 '2X CEE Steckdosen Unit 1.3	

#79 4x CEE Steckdosen Unit 1.2-3xTore + CEE Typ: NYY-J 5x4	Fertig	NYY-J 5x4 Trommel 1 110m	HV Unit 1.2 '4x CEE Steckdosen Unit 1.2 3x Tor +CEE	
#78 CEE Steckdose 32A Unit 1.2 Typ: NYY-J 5x16	Fertig	Mennekes Hallen Trommel 2 60m	HV Unit 1.2 'CEE Steckdose 32A Unit 1.2	
#77 4x CEE Steckdosen 32A Unit 1.2 Typ: NYY-J 5x16	Fertig	Mennekes Hallen Trommel 2 130m	HV Unit 1.2 '4x CEE Steckdosen Unit 1.2	
#75 3X CEE Stecdosen Halle 1.1-Kreis 4 3xTore Typ: NYY-J 5x4	Fertig	NYY-J 5x4 Trommel 1 120m	HV Unit1.1 '4X CEE Stecdosen Halle 1.1-Kreis 4 3xTore + CEE	
#74 4X CEE Stecdosen Halle 1.1-Kreis 3 Tore Typ: NYY-J 5x2,5	Fertig	NYY-J 5x2,5 Trommel 1 80m	HV Unit1.1 '4X CEE Stecdosen Halle 1.1-Kreis 3 Tore	
#73 4X CEE Stecdosen 32A Halle 1.1 Typ: NYY-J 5x16	Fertig	Mennekes Hallen Trommel 1 160m	HV Unit1.1 '4X CEE Stecdosen Halle 1.1-Kreis 2	
#72 Einspeisung 2 Mezzanine EG Unit 1.3 Typ: NYY-J 3x4	Fertig	NYY-J 3x4 trommel 1 250m	Sibe Zentrale 'Mezzanine EG Unit 1.3	
#71 Einspeisung 1 Mezzanine EG Unit 1.3 Typ: NYY-J 3x4	Fertig	NYY-J 3x4 trommel 2 250m	Sibe Zentrale 'Mezzanine EG Unit 1.3	
#69 Einspeisung 2 virtueller Brandabschnitt C Halle Unit 1.3 Typ: NYY-J 3x2,5	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 1 97m	Sibe Zentrale 'Virtueller Brandabschnitt C Halle Unit 1.3virtueller Brandabschnitt C Halle Unit 1.3	
#68 Einspeisung 1 virtueller Brandabschnitt C Halle Unit 1.3 Typ: NYY-J 3x2,5	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 2 95m	Sibe Zentrale 'Virtueller Brandabschnitt C Halle Unit 1.3	
#67 Einspeisung 2 virtueller Brandabschnitt B Halle Unit 1.3 Typ: NYY-J 3x2,5	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 1 87m	Sibe Zentrale 'Virtueller Brandabschnitt B Halle Unit 1.3	
#66 Einspeisung 1 virtueller Brandabschnitt B Halle Unit 1.3 Typ: NYY-J 3x2,5	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 2 85m	Sibe Zentrale 'Virtueller Brandabschnitt B Halle Unit 1.3	
#65 Einspeisung 2 virtueller Brandabschnitt A Halle Unit 1.1 Typ: NYY-J 3x2,5	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 1 71m	Sibe Zentrale 'Virtueller Brandabschnitt A Halle Unit 1.3	
#64 Einspeisung 1 virtueller Brandabschnitt A Halle Unit 1.3 Typ: NYY-J 3x2.5	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 2 70m	Sibe Zentrale 'Einspeisung 1 virtueller Brandabschnitt A Halle Unit irtueller Brandabschnitt A Halle Unit 1.3	

#63 Einspeisung 2 TRH Unit 1.3 Typ: NYY-J 3x4	Fertig	NYY-J 3x4 trommel 1 250m	Sibe Zentrale 'TRH Unit 1.3	
#60 Sprinkler zentrale Zuleitung Typ: NAYY-J 5x35	Fertig	UV Allg. EG Unit 3 100m	UV Allgemein 'Sprikler	
#59 Einspeisung 1 TRH Unit 1.3 Typ: NYY-J 3x4	Fertig	NYY-J 3x4 trommel 2 250m	Sibe Zentrale 'TRH Unit 1.3	
#58 Einspeisung Mezzanine EG Unit 1.2 Typ: NYY-J 3x4	Fertig	NYY-J 3x4 trommel 3 110m	Sibe Zentrale 'Mezzanine EG Unit 1.2	
#57 Einspeisung 1 Mezzanine EG Unit 1.2 Typ: NYY-J 3x4	Fertig	NYY-J 3x4 trommel 3 110m	Sibe Zentrale 'Mezzanine EG Unit 1.2	
#56 Einspeisung 2 virtueller Brandabschnitt B Halle Unit 1.2 Typ: NYY-J 3x2.5	Fertig	NYY-J 3x2.5 95m	Sibe Zentrale 'Virtueller Brandabschnitt B Halle Unit 1.2	
#55 Einspeisung 1 virtueller Brandabschnitt B Halle Unit 1.2 Typ: NYY-J 3x2.5	Fertig	NYY-J 3x2.5 95m	Sibe Zentrale 'Virtueller Brandabschnitt B Halle Unit 1.2	
#54 Einspeisung 2 virtueller Brandabschnitt A Halle Unit 1.2 Typ: NYY-J 3x2.5	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 4 71m	Sibe Zentrale 'Virtueller Brandabschnitt A Halle Unit 1.2	
#53 Einspeisung 1 virtueller Brandabschnitt A Halle Unit 1.2 Typ: NYY-J 3x2.5	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 4 71m	Sibe Zentrale 'Virtueller Brandabschnitt A Halle Unit 1.2	
#52 Einspeisung 2 TRH Unit 1.2 Typ: NYY-J 3x4	Fertig	NYY-J 3x4 trommel 3 130m	Sibe Zentrale 'TRH Unit 1.2	
#51 Einspeisung 1 TRH Unit 1.2 Typ: NYY-J 3x4	Fertig	NYY-J 3x4 trommel 3 130m	Sibe Zentrale 'TRH Unit 1.2	
#50 Einspeisung 2 Mezzanine EG Unit 1.1 Typ: NYY-J 3x2,5	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 3 45m	Sibe Zentrale 'Mezzanine EG Unit 1.1	
#49 Einspeisung 1 Mezzanine EG Unit 1.1 Typ: NYY-J 3x2,5	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 4 46m	Sibe Zentrale 'Mezzanine EG Unit 1.1	
#48 Einspeisung 2 virtueller Brandabschnitt C Halle 1.1 Typ: NYY-J 3x2,5	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 3 60m	Sibe Zentrale 'Virtueller Brandabschnitt C Halle 1.1	
#47 Einspeisung 1 virtueller Brandabschnitt C Halle 1.1 Typ: NYY-J 3x2,5	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 3 60m	Sibe Zentrale 'Virtueller Brandabschnitt C Halle 1.1	

#46 Einspeisung 2 virtueller Brandabschnitt B Halle Unit 1.1 <i>Typ: NYY-J 3x2,5</i>	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 3 32m	Sibe Zentrale 'Virtueller Brandabschnitt B Halle Unit 1.1	
#45 Einspeisung 1 virtueller Brandabschnitt B Halle Unit 1.1 <i>Typ: NYY-J 3x2,5</i>	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 4 33m	Sibe Zentrale 'Virtueller Brandabschnitt B Halle Unit 1.1	
#44 Einspeisung virtueller Brandabschnitt A Halle Unit 1.1 <i>Typ: NYY-J 3x2,5</i>	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 3 10m	Sibe Zentrale 'Virtueller Brandabschnitt A Halle Unit 1.1	
#43 Einspeisung 1 virtueller Brandabschnitt A Halle Unit 1.1 <i>Typ: NYY-J 3x2,5</i>	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 4 10m	Sibe Zentrale 'Virtueller Brandabschnitt A Halle Unit 1.1	
#42 Einspeisung 2 TRH Unit 1.1 <i>Typ: NYY-J 3x2,5</i>	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 4 36m	Sibe Zentrale 'TRH Unit 1.1	
#41 Einspeisung 1 TRH Unit 1.1 <i>Typ: NYY-J 3x2,5</i>	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 4 36m	Sibe Zentrale 'TRH Unit 1.1	
#40 Einspeisung 2 Technikräume <i>Typ: NYY-J 3x2,5</i>	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 3 20m	Sibe Zentrale 'Technikraum 1.1	
#39 Einspeisung 1 Technikräume <i>Typ: NYY-J 3x2,5</i>	Fertig	NYY-J 3x2,5 Trommel 4 20m	Sibe Zentrale 'Technikraum 1.1	
#38 Brücke HV 1 zu HV 2-A-2YF(L)2Y 10x2x0,8 <i>Typ: A-2YF(L)2Y 10x2x0,8</i>	Fertig	Brücken HVs A-2YF(L)2Y 10x2x0,8 115m	HV Unit 1 'HV Unit 2	
#37 Brücke HV 1 zu HV 3-A-2YF(L)2Y 10x2x0,8 <i>Typ: A-2YF(L)2Y 10x2x0,8</i>	Fertig	Brücken HVs A-2YF(L)2Y 10x2x0,8 350m	HV Unit 1 'HV Unit 3	
#36 Brücke HV 1 zu HV 3 NYY-J 7x2,5 <i>Typ: NYY-J 7x2,5</i>	Fertig	Halle Uvs Brücken 350m	HV Unit 1 'HV Unit 3	
#35 Brücke HV 1 zu HV 2 NYY-J 7x2,5 <i>Typ: NYY-J 7x2,5</i>	Fertig	Halle Uvs Brücken 115m	HV Unit 1 'HV Unit 2	
#34 Ladesäulen HV2 <i>Typ: NYY-J 5x25</i>	Fertig	Ladesäulen HVs 33m	HV Unit 2 'Draußen Ladesäule	
#33 Ladesäulen HV3 <i>Typ: NYY-J 5x25</i>	Fertig	Ladesäulen HVs 33m	HV Unit 3 'Draußen Ladesäule	
#32 Ladesäulen HV1 <i>Typ: NYY-J 5x25</i>	Fertig	Ladesäulen HVs 33m	HV Unit 1 'Draussen Ladesäule	

#31 UV Allg. EG Unit 3 Typ: NAYY-J 5x35	Fertig	UV Allg. EG Unit 3 250m	NSHV 'UV Allg. EG Unit 3	
#30 UV WP Unit 1 PE Typ: NAYY-O 1x120	Fertig	NSHV HV Unit 1 L1-PE- NSHV UV WP Unit- L1-PE 35m	NSHV 'UV WP Unit 1	
#29 HV Unit 1 PE Typ: NAYY-O 1x120	Fertig	NSHV HV Unit 1 L1-PE- NSHV UV WP Unit- L1-PE 35m	NHSV 'NSHV HV Unit 1	
#28 UV WP Unit 1 N Typ: NAYY-O 1x240	Fertig	HV Unit 1 + UV WP Unit 1 L1-N 35m	NSHV 'UV WP Unit 1	
#27 UV WP Unit 1 L3 Typ: NAYY-O 1x240	Fertig	HV Unit 1 + UV WP Unit 1 L1-N 35m	NSHV 'UV WP Unit 1	
#26 UV WP Unit 1 L2 Typ: NAYY-O 1x240	Fertig	HV Unit 1 + UV WP Unit 1 L1-N 35m	NSHV 'UV WP Unit 1	
#25 UV WP Unit 1 L1 Typ: NAYY-O 1x240	Fertig	HV Unit 1 + UV WP Unit 1 L1-N 35m	NSHV 'UV WP Unit 1	
#24 NSHV HV Unit 1 N Typ: NAYY-O 1x240	Fertig	HV Unit 1 + UV WP Unit 1 L1-N 35m	NHSV 'NSHV HV Unit 1	
#23 NSHV HV Unit 1 L3 Typ: NAYY-O 1x240	Fertig	HV Unit 1 + UV WP Unit 1 L1-N 35m	NHSV 'NSHV HV Unit 1	
#22 NSHV HV Unit 1 L2 Typ: NAYY-O 1x240	Fertig	HV Unit 1 + UV WP Unit 1 L1-N 35m	NHSV 'NSHV HV Unit 1	
#21 NSHV HV Unit 1 L1 Typ: NAYY-O 1x240	Fertig	HV Unit 1 + UV WP Unit 1 L1-N 35m	NHSV 'NSHV HV Unit 1	
#20 UV WP Unit 2 PE Typ: NAYY-O 1x120	Fertig	NSHV HV Unit 2 NSHV UV WP Unit 2 PE UV WP Unit 1 PE HV Unit 1 PE 115m	NSHV 'UV WP Unit 2	
#19 HV Unit 2 PE Typ: NAYY-O 1x120	Fertig	NSHV HV Unit 2 NSHV UV WP Unit 2 PE UV WP Unit 1 PE HV Unit 1 PE 115m	NSHV 'HV Unit 2	
#18 UV WP Unit 2 N Typ: NAYY-O 1x240	Fertig	NSHV UV WP Unit 2 L1-N 115m	NSHV 'HV Unit 2	

#17 UV WP Unit 2 L3 Typ: NAYY-O 1x240	Fertig	NSHV UV WP Unit 2 L1-N 115m	NSHV 'UV WP Unit 2	
#16 UV WP Unit 2 L2 Typ: NAYY-O 1x240	Fertig	NSHV UV WP Unit 2 L1-N 115m	NSHV 'UV WP Unit 2	
#15 UV WP Unit 2 L1 Typ: NAYY-O 1x240	Fertig	NSHV UV WP Unit 2 L1-N 115m	NSHV 'UV WP Unit 2	
#14 HV Unit 2 N Typ: NAYY-O 1x240	Fertig	NSHV HV Unit 2 L1-N 115m	NSHV 'HV Unit 2	
#13 HV Unit 2 L3 Typ: NAYY-O 1x240	Fertig	NSHV HV Unit 2 L1-N 115m	NSHV 'HV Unit 2	
#12 HV Unit 2 L2 Typ: NAYY-O 1x240	Fertig	NSHV HV Unit 2 L1-N 115m	NSHV 'HV Unit 2	
#11 HV Unit 2 L1 Typ: NAYY-O 1x240	Fertig	NSHV HV Unit 2 L1-N 115m	NSHV 'HV Unit 2	
#10 UV WP Unit 3 PE Typ: NAYY-O 1x120	Fertig	NSHV HV Unit 3 NSHV UV WP Unit 3 PE 240m	NSHV 'UV WP Unit 3	
#9 HV Unit 3 PE Typ: NAYY-O 1x120	Fertig	NSHV HV Unit 3 NSHV UV WP Unit 3 PE 240m	NSHV 'HV Unit 3	
#8 UV WP Unit 3 N Typ: NAYY-O 1x240	Fertig	NSHV UV WP Unit 3 N 240m	NSHV 'UV WP Unit 3	
#7 UV WP Unit 3 L3 Typ: NAYY-O 1x240	Fertig	NSHV UV WP Unit 3 L3 240m	NSHV 'UV WP Unit 3	
#6 UV WP Unit 3 L2 Typ: NAYY-O 1x240	Fertig	NSHV UV WP Unit 3 L2 240m	NSHV 'UV WP Unit 3	
#5 UV WP Unit 3 L1 Typ: NAYY-O 1x240	Fertig	NSHV UV WP Unit 3 L1 240m	NSHV 'UV WP Unit 3	
#4 HV Unit 3 N Typ: NAYY-O 1x240	Fertig	NSHV HV Unit 3 N 240m	NSHV 'HV Unit 3	
#3 HV Unit 3 L3 Typ: NAYY-O 1x240	Fertig	NSHV HV Unit 3 L3 240m	NSHV 'HV Unit 3	

#2 HV Unit 3 L2
Typ: NAYY-O 1x240

Fertig

NSHV HV Unit 3 L2
240m

NSHV 'HV Unit 3



#1 HV Unit 3 L1
Typ: NAYY-O 1x240

Fertig

NSHV HV Unit 3 L1
240m

NSHV 'HV Unit 3



Trommelliste

Name	Kabeltyp	Länge (ges./verbr.)	QR-Code
#1029 BMA Erdkabel Trommel 1 2x2x0,8	A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	500m Verbr.: 500m	
#1030 BMA Erdkabel Trommel 2 2x2x0,8	A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	500m Verbr.: 499m	
#1043 BMA Erdkabel Trommel 3	A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	500m Verbr.: 501m	
#1031 BMA Erdkabel Trommel 3 2x2x0,8	A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	500m Verbr.: 500m	
#1039 BMA Erdkabel Trommel 4	A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	500m Verbr.: 500m	
#1042 BMA Erdkabel Trommel 5	A-2YF(L)2Y 2x2x0,8	500m Verbr.: 500m	
#1045 BMA Sirenen	A-2YF(L)2Y 4x2x0,8	500m Verbr.: 499m	
#1016 Brücken HVs A-2YF(L)2Y 10x2x0,8	A-2YF(L)2Y 10x2x0,8	500m Verbr.: 465m	
#1015 Halle Uvs Brücken	NY-Y-J 7x2,5	500m Verbr.: 500m	
#1028 Hallen UV Brücke A-2YF(L)2Y 10x2x0,8	A-2YF(L)2Y 10x2x0,8	500m Verbr.: 501m	
#1036 HV Unit 1 + UV WP Unit 1 L1-N	NAYY-O 1x240	300m Verbr.: 280m	
#1014 Ladesäulen HVs	NY-Y-J 5x25	100m Verbr.: 99m	
#1017 LVL Singlemode	A-DQ(ZN)B2Y 12 E9	500m Verbr.: 440m	
#1040 Mennekes Hallen Trommel 1	NY-Y-J 5x16	500m Verbr.: 480m	

#1041 Mennekes Hallen Trommel 2	NY-Y-J 5x16	500m Verbr.: 190m	
#1011 NSHV HV Unit 1 L1-PE NSHV UV WP Unit L1-PE	NAYY-O 1x120	350m Verbr.: 70m	
#1009 NSHV HV Unit 2 L1-N	NAYY-O 1x240	460m Verbr.: 460m	
#1012 NSHV HV Unit 2 NSHV UV WP Unit 2 PE UV WP Unit 1 PE HV Unit 1 PE	NAYY-O 1x240	330m Verbr.: 230m	
#1007 NSHV HV Unit 3 L1	NAYY-O 1x240	240m Verbr.: 240m	
#1000 NSHV HV Unit 3 L2	NAYY-O 1x240	240m Verbr.: 240m	
#1001 NSHV HV Unit 3 L3	NAYY-O 1x240	240m Verbr.: 240m	
#1002 NSHV HV Unit 3 N	NAYY-O 1x240	240m Verbr.: 240m	
#1008 NSHV HV Unit 3 NSHV UV WP Unit 3 PE	NAYY-O 1x120	480m Verbr.: 480m	
#1010 NSHV UV WP Unit 2 L1-N	NAYY-O 1x240	460m Verbr.: 460m	
#1003 NSHV UV WP Unit 3 L1	NAYY-O 1x240	240m Verbr.: 240m	
#1004 NSHV UV WP Unit 3 L2	NAYY-O 1x240	240m Verbr.: 240m	
#1005 NSHV UV WP Unit 3 L3	NAYY-O 1x240	240m Verbr.: 240m	
#1006 NSHV UV WP Unit 3 N	NAYY-O 1x240	240m Verbr.: 240m	
#1019 NY-Y-J 3x2,5 Trommel 1	NY-Y-J 3x2,5	500m Verbr.: 499m	

#1032 NYY-J 3x2,5 Trommel 2	NYY-J 3x2,5	500m Verbr.: 420m	
#1033 NYY-J 3x2,5 Trommel 3	NYY-J 3x2,5	500m Verbr.: 382m	
#1038 NYY-J 3x2,5 Trommel 4	NYY-J 3x2,5	500m Verbr.: 500m	
#1046 NYY-J 3x2.5	NYY-J 3x2,5	500m Verbr.: 190m	
#1020 NYY-J 3x4 trommel 1	NYY-J 3x4	500m Verbr.: 500m	
#1034 NYY-J 3x4 trommel 2	NYY-J 3x4	500m Verbr.: 500m	
#1035 NYY-J 3x4 trommel 3	NYY-J 3x4	500m Verbr.: 480m	
#1021 NYY-J 5x2,5 Trommel 1	NYY-J 5x2,5	500m Verbr.: 475m	
#1022 NYY-J 5x2,5 Trommel 2	NYY-J 5x2,5	500m Verbr.: 320m	
#1023 NYY-J 5x2,5 Trommel 3	NYY-J 5x2,5	500m Verbr.: 0m	
#1025 NYY-J 5x4 Trommel 1	NYY-J 5x4	500m Verbr.: 350m	
#1018 Serverraum Brücken	A-2YF(L)2Y 10x2x0,8	500m Verbr.: 285m	
#1013 UV Allg. EG Unit 3	NAYY-J 5x35	350m Verbr.: 350m	
#1026 UV Brücken 4x2x0,8	A-2YF(L)2Y 4x2x0,8	500m Verbr.: 501m	
#1027 UV Brücken Simplex Erdkabel	STP 4x2X AWG23	500m Verbr.: 350m	
